



REULET INGENIERIE
SAINT GAUDENS

Reçu le 24 OCT. 2008

N° 74663

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 33

CARREFOUR GIRATOIRE AVEC LA
RD33D – P.R 9+978
COMMUNE DE BARBAZAN

Marché J. LEFEBVRE
n° 563/08

COMPTE RENDU DE REUNION N° 02 REUNION DE PREPARATION

DATES : 14 OCTOBRE 2008
15 OCTOBRE 2008
16 OCTOBRE 2008

Entité	Nom du représentant	Adresse	N° téléphone	N° télécopie	Présent	Convoqué prochaine réunion	Diffusion du compte rendu
Maîtrise d'œuvre Travaux – CG 31 Service Maîtrise d'Oeuvre Travaux Sud (SMOTS)	M. CONZE M. LOPEZ M. SERMOT	Lieu dit Saint-Pé 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.74.60	05.62.00.74.61	X X X	X X X	X X X
Maîtrise d'œuvre Etudes – CG 31 Service des Etudes Sud (SES)	M. DESJARDINS M. BATAILLE	RN 117–Lieu dit Saint-Pé 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.83.20	05.61.89.65.35		X X	X X
Coordonnateur SPS Groupement (SPS) REULET / TORMO	M. TORMO	6 bis, bd Pasteur 31 800 Saint-Gaudens	05.61.94.93.00	05.61.95.27.38	X	X	X
Entreprise mandataire J. LEFEBEVRE(EJL)	M. CARIVEN Mlle HOCQUARD-B. M. CABANIE	5 pl du Gaillard du Port 31410 Noe	05.61.87.13.36	05.61.87.06.46	X X	X X	X X X
Gestionnaire de la Voie – CG 31 (SR) Secteur routier de Saint-Gaudens	M. NOMDEDEU M. ADER M. SOST	Rue Blériot 31806 Saint-Gaudens	05.62.00.84.20	05.62.00.84.21	X X	X X	X X X
Syndicat des Eaux de la Barousse	M. OIRY	Ch. de la Chapelle 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.80.60	05.62.00.80.69	X		X
Gaz de France	M. PRADIER M. SAURAT	11 rue Marsoulas 31800 Saint-Gaudens	05.61.94.74.26	05.61.94.74.06	X		X
France TELECOM	M. REY M. VANPOPERINGHE	17 rue de l'Indépendance 31800 Saint-Gaudens	05.61.89.88.62	05.61.95.17.44	X		X

EDF	M. ANDRIEU	11 rue Marsoulas 31800 Saint-Gaudens	05.62.00.94.47	05.62.00.94.31	X		X
Compagnie Electrique des Réseaux Aériens et Souterrains (C.E.R.A.S)	M. BARBOTIN	Av. Descartes Zone Industrielle 33 370 Artigues près Bordeaux	05.56.86.01.12	05.56.32.09.99	X		X
SDEHG	M. BAJOLLE	9 rue des 3 Banquets 31080 Toulouse	05.61.33.46.22	05.61.55.30.71	X		X
Mairie de BARBAZAN	M. le Maire	Village 31510 Barbazan	05.61.88.30.06	05.61.88.39.06			X
Mairie de LOURES BAROUSSE	M. le Maire	Place de la Mairie 65370 Loures Barousse	05.62.99.21.28	05.62.99.23.28			X

ACTION

Les remarques concernant le présent compte-rendu doivent être formulées au plus tard lors de la prochaine réunion.
Passé ce délai, il sera considéré comme adopté.

**Destinataires du
compte rendu**

A/ APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE RENDU :

Le précédent compte rendu n° 01 du 6 octobre 2008 est approuvé sans réserve par l'ensemble des participants.

B/ FOUNTURE DOCUMENTS :

L'entreprise a remis à la maîtrise d'œuvre les documents suivants :

- planning exécution des travaux,
- phasage travaux sous circulation,
- sous détail de prix suivant liste demandée.

L'entreprise a remis au gestionnaire de la voie les documents suivants :

- planning exécution des travaux,
- phasage travaux sous circulation.

Le maître d'œuvre a adressé à l'entreprise les plans de l'aménagement sous fichiers informatique.

C/ DOCUMENTS EN ATTENTE :

L'entreprise devra fournir à la maîtrise d'œuvre les documents suivants :

- vision de l'entreprise sur les quantités de l'avant métré,
- résultats des sondages effectués hors emprises travaux pour valider les remblais d'emprunt,
- proposition de prix pour les bordures type P2,
- § liste 2-3 du CCTP.

EJL

D/ PIQUETAGE GENERAL :

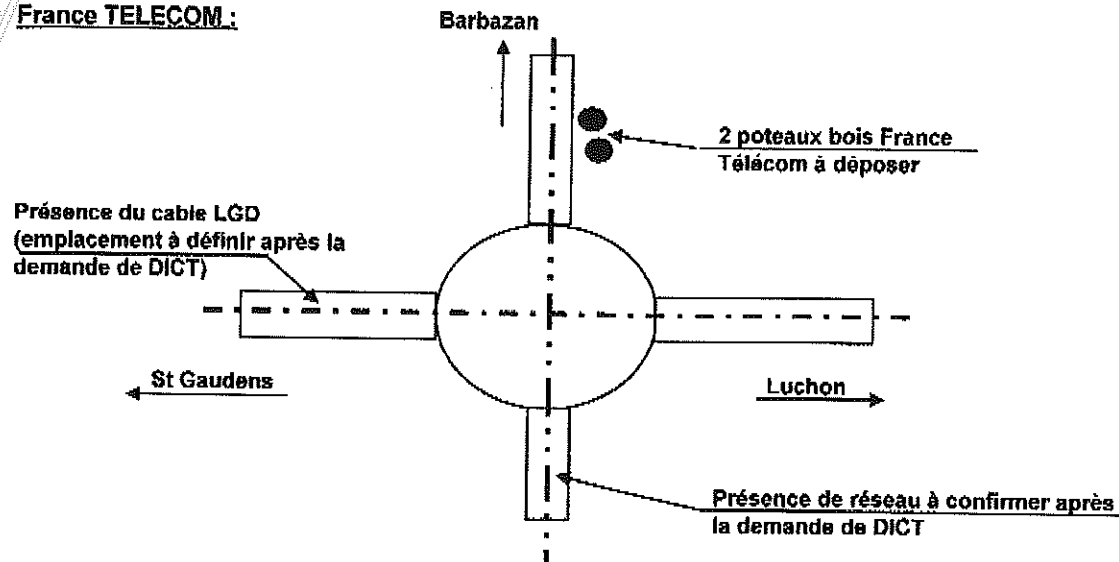
Quatre points référentiels seront implantés par le géomètre mandaté par le maîtres d'ouvrage.

A partir de ces points, l'entreprise fera procéder à l'implantation des différents axes et déports nécessaires aux travaux.

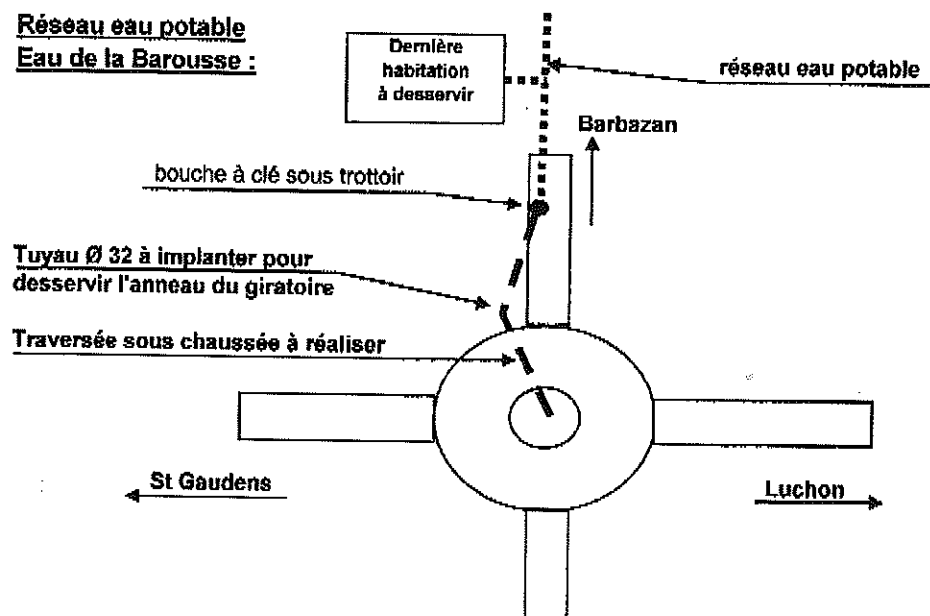
SMOTS

EJL



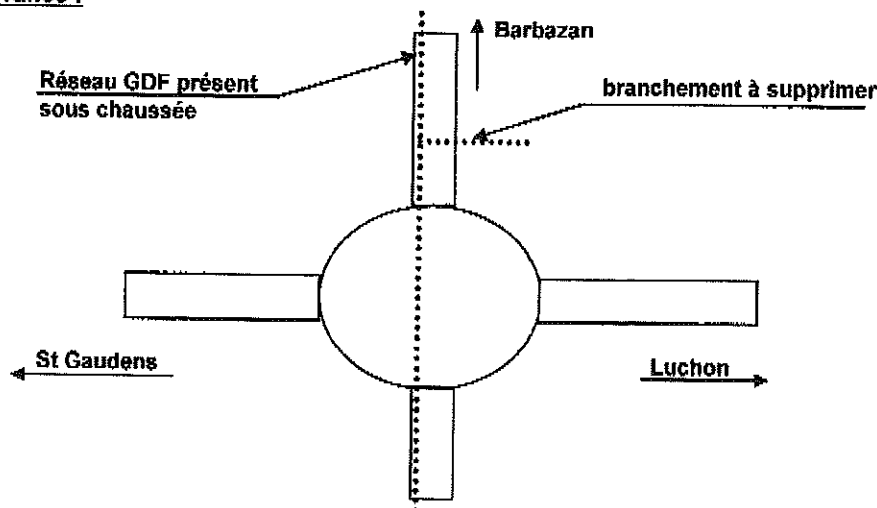
CONCESSIONNAIRES :**France TELECOM :**

Les deux poteaux bois ainsi que le câble aérien seront déposés avant la semaine n° 46 par le concessionnaire.

Réseau eau potable**Eau de la Barousse :**

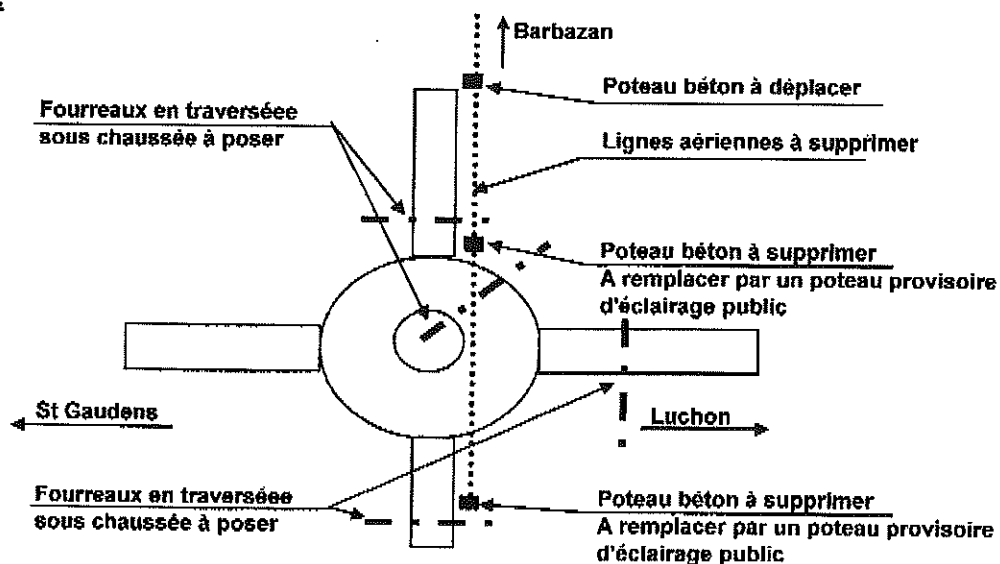
Afin d'alimenter l'aménagement de l'anneau du giratoire, un tuyau Ø 32 sera à poser à partir de la dernière bouche à clé. Ce tuyau pourrait être posé par l'entreprise Jean Lefebvre.

Le raccordement du tuyau au niveau de la bouche à clé pourra être effectué par le concessionnaire pendant la phase travaux.

Gaz de France :

Un ancien branchement présent sous la RD33D sera mis hors service par le concessionnaire. Cette intervention sera effective avant la semaine n° 46.



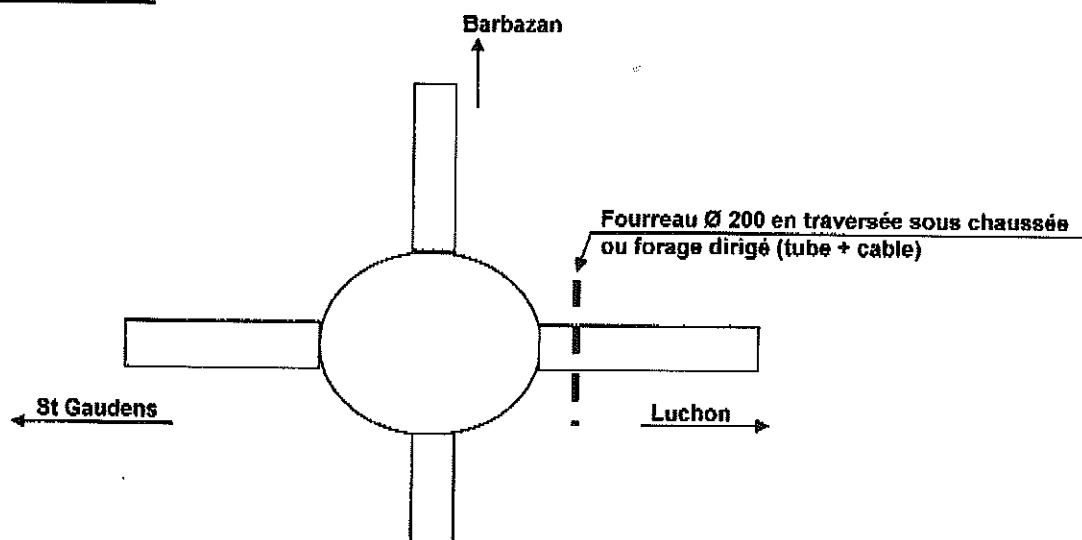
Eclairage Public**SDEHG :**

Dépose de deux portées par EDF semaine n° 45 (attente délibération communale)

Conservation d'un éclairage de deux lanternes en provisoire sur supports mobiles.

Projet d'éclairage public sur le giratoire : la commune doit délibérer pour solliciter le SDEHG pour l'étude et la mise en œuvre projet EP.

Des fourreaux pourraient être posés en traversée sous chaussée par l'entreprise Jean Lefebvre pour alimenter l'anneau du giratoire et pour le futur éclairage (Ø 110 mm).

EDF Réseau Sud-Ouest**Entreprise C.E.R.A.S. :**

Un projet de réseau HTA enterré est programmé en 2009 par le concessionnaire.

Dans cette hypothèse, un fourreau Ø 200 mm serait à implanter dans la traversée sous chaussée réalisée pour le projet d'éclairage public.

Réflexion à mener sur l'opportunité d'un forage dirigé réalisé par l'entreprise C.E.R.A.S.



ACTION**F/ REALISATION DE SONDAGES :**

Des sondages au droit des îlots existant seront réalisés par l'entreprise pour déterminer la structure existante.

EJL

G/ CONDITIONS A MAINTENIR PENDANT TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX -**RAPPEL :**

Le maître d'œuvre informe l'entreprise des conditions à maintenir pendant toute la durée des travaux :

- chantier à réaliser en maintenant une circulation bidirectionnelle sur la RD33,
- transparence piétons et cyclistes sur la RD33 avec îlot transitoire en milieu de chaussée,
- accès au Casino de Barbazan par la RD33D pendant les week end avec impérativement un tourne à gauche sur la RD33.

EJL

PROCHAINE REUNION : **Mardi 21 octobre 2008 à 9h30 sur le chantier**

Pour le Maître d'œuvre
Le Contrôleur Principal

F. LOPEZ

Le représentant de l'entreprise

Y. HOCQUARD-BASINET
